



Progresso de Projetos - TC

Transparência e Comunicação

Area

Todos

Nome do Projeto

Escola de Trabalho e Produção do ...

Custos

Todos

Progresso

Nome do Projeto	Início	Término	Total Tarefas	Completas
Escola de Trabalho e Produção do Pará - ETPP	15/06/2020	15/08/2022	1.461	743
Total			1.461	743

Progresso Físico

% Previsto	% Realizado
62,3%	61,9%

Progresso Financeiro (MBRL)

Nome do Projeto	Orçamento	Gasto
Escola de Trabalho e Produção do P...	25.000.000	8.107.947
Total	25.000.000	8.107.947

Cronograma | Linha do Tempo


Timeline from ut 2020 to ago 2022

Escola de Trabalho e Produção do Pará - ETPP

Proximos Marco | Tarefas

Nome do Projeto	Marco do Projeto	Término	Status	KPI
Escola de Trabalho e Produção do Pará - ETPP	Engenharia	06/04/21	Concluído	✓
Escola de Trabalho e Produção do Pará - ETPP	Fase - Iniciação	14/05/21	Concluído	✓
Escola de Trabalho e Produção do Pará - ETPP	Fase - Aquisições	14/09/21	Concluído	✓
Escola de Trabalho e Produção do Pará - ETPP	Construção da Escola Técnica	24/06/22	Em andamento	!
Escola de Trabalho e Produção do Pará - ETPP	Fase - Encerramento [RFO]	15/08/22	Futuro	✓

Previsto vs Realizado

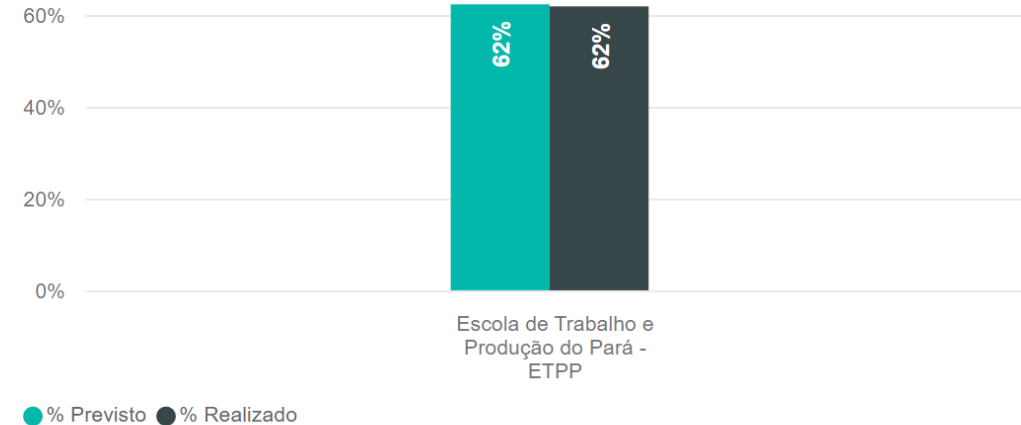

● % Previsto ● % Realizado
