



Progresso de Projetos - TC

Transparência e Comunicação

Area

Todos

Nome do Projeto

Unidade de Triagem de materiais r...

Custos

Todos

Progresso

Nome do Projeto	Início	Término	Total Tarefas	Completas
Unidade de Triagem de materiais recicláveis de Barcarena - ...	03/08/2018	30/06/2022	1.002	970
Total			1.002	970

Progresso Físico

% Previsto	% Realizado
100,0%	99,5%

Progresso Financeiro (MBRL)

Nome do Projeto	Orçamento	Gasto
Unidade de Triagem de materiais rec...	30.000.000	25.605.945
Total	30.000.000	25.605.945

Cronograma | Linha do Tempo


2020 set 2020 out 2020 nov 2020 dez 2020 jan 2021 fev 2021 mar 2021 abr 2021 mai 2021 jun 2021 jul 2021 ago 2021 set 2021 out 2021 nov 2021 dez 2021 jan 2022 fev 2022 mar 2022 abr 2022 mai 2022 jun 2022

Unidade de Triagem de materiais recicláveis de Barcarena - UT

Proximos Marco | Tarefas

Nome do Projeto	Marco do Projeto	Término	Status	KPI
Unidade de Triagem de materiais recicláveis de Barcarena - ...	Engenharia	08/12/21	Concluído	✓
Unidade de Triagem de materiais recicláveis de Barcarena - ...	Suprimentos	23/05/22	Em andamento	✓
Unidade de Triagem de materiais recicláveis de Barcarena - ...	Construção	23/06/22	Em andamento	✓
Unidade de Triagem de materiais recicláveis de Barcarena - ...	Gerenciamento	30/06/22	Em andamento	✓
Unidade de Triagem de materiais recicláveis de Barcarena - ...	Conclusão do Projeto	30/06/22	Futuro	✓

Previsto vs Realizado

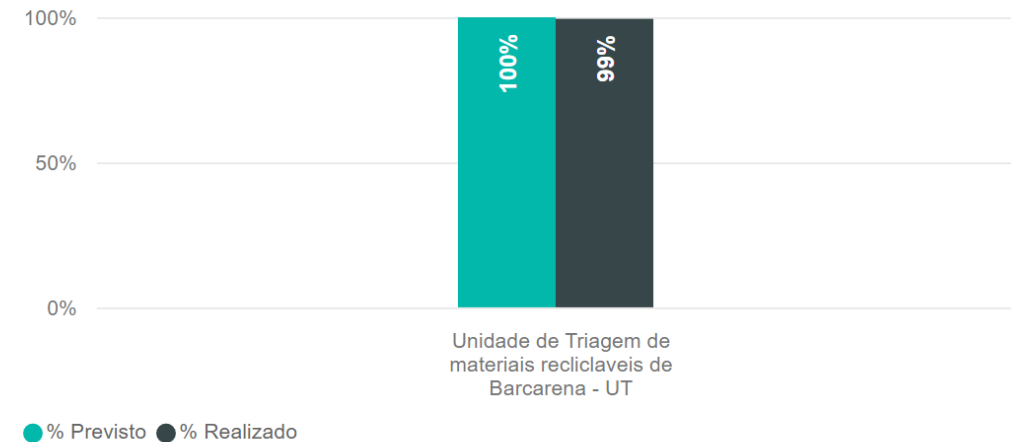

● % Previsto ● % Realizado
